



Tento projekt, "Stavební úpravy a přestavba budovy Obecního úřadu v Jahodově" byl realizován za podpory Královéhradeckého kraje.

Komentář a fotodokumentace akce "Stavební úpravy a přístavba budovy OÚ Jahodov".

8.4. 2013

Zahájení prací. Proveden výkop základové spáry pro přístavbu. Rozbíjení desky pod dřevníkem-pneukladivo. Přetržena vodovodní přípojka-opravil Ksandr. Materiál z výkopu navezen k salaši.

9.4.2013

Vybetonování základové spáry. 2x mix 5 + 2 m³ betonu. Odstranění lina a rámců vnitřních oken a vnitřních dveří.

10.4.2013

Přivezen skelet žumpy a vodoměrné šachty (Jaroměř). Dobetonovány základy do roviny, včetně prostupů vody a odpadů. Podřezání zdiva v býv.knihovně nepůjde. Dohadován s p.Zimou nástřik?? proti vlhnutí. Ten byl odmítnut a roh za přístavbou bude pro izolaci vybourán. Vodoinstalatér vyměřil výšky odpadů a pod přístavbu položeny odpad.roury a prostup pro vodovod.



11.4.2013

Ráno vyhrnuta zemina u salaše- JCB. Zhotoveno šalování pro desku. Položena armatura a zabetonována vrchní deska. Mix 3m³ betonu vozeno ze silnice JCB.

12.4.2013

Podbourávání základů v knihovně, pokládání izolace a vyzdívání.



19.4.2013 Zhotovení věnce přístavby.



23.4.2012

Zhotovena armatura stopů v přístavbě. Ve 12,30 provedeno zabetonování - mix cca 3m3 .



29.4.2013

Nastoupila parta tesařů (p.Čvančara). Odkrytí tašek a zhotovení krovů nad přístavbou.



30.4.2013

Dokončování střechy (krovy, latě atd.) Dozdívání štítů a přizdívání půlštoků ve II.podlaží.



4.5.2013 - sobota

Pokračují pokrývačské práce. Je instalováno 5 střešních oken.





7.5.2013 a 9.5.2013

Pokračuje zdění příček v přízemí a ve II. podlaží Pokračuje zdění příček v přízemí a v I. podlaží. Příprava základů pro pokládání nových nosných trámů-roštu.



10.5.2013

Dozdívání příček ve II.podlaží. Proveden postřik starých starých trámů - (lignofix). Tesaři položili nové polštáře a provedli položení podkladových USB desek.






13.5.2013

Byla vybourána vnější okna a započalo přizdívání pro okna nová, menší, ze Stavony Libchavy. Dohodnuta šířka vnějšího parapetu (20cm).

14.5.2013

Pokračovalo přizdívání oken. Byl vybourán otvor pro dveře z kuchyně. Vybourány luxfery v chodbě (nad starou sektorkou).

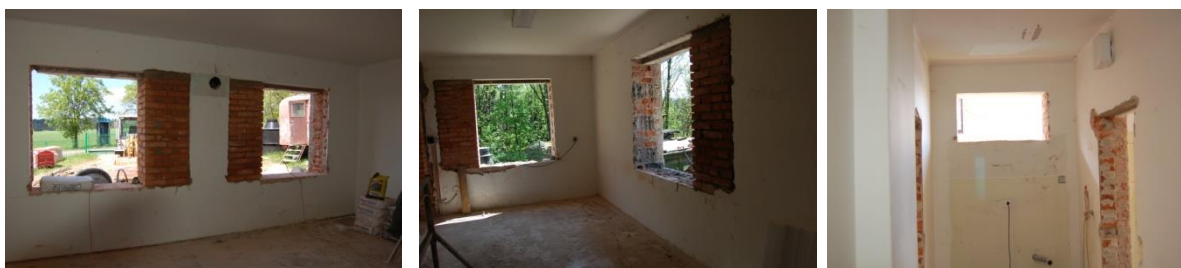

15.5.2013

Vyzděna příčka mezi kuchyní a archivem z kanceláře. Vyzděny otvory pro dveře z kuchyně a okno v chodbě. Přizděn otvor pro hlavní dveře a kromě toho pokračovalo přizdívání půlštoků ve II. podlaží. Vysekávání pro vodoinstalce.



16.5.2013

Stavona Libchavy provedla instalaci oken a dveří(hlavní a z kuchyně). Objednáno okno do příčky v kuchyni (48x90), kvůli prosvětlení kuchyně z archivu). Dělníci ze Stavitelství přesunuti na jinou akci (Šachov).



17.5.2013

Práce na vnitřní vodoinstalaci započnuta. Dohodnut přesun umyvadla a wc ve II.podlaží. Zástupce firmy Mobau p. Schejbal si změřil a dohodnul umístění vnitřních dveří (v úvahu přichází světlý dub nebo limba).



27.5.2013

Započato s výkopem pro žumpu a úpravou terénu. Žumpa byla uložena na vybetonovanou desku, naplněna z hasičské cisterny a obsypána šotolinou. Dále bylo provedeno napojení na vnitřní kanalizaci.



5.6.2013

Započaly práce na připojení srážkových vod. Vyhlobeny odvodňovací rýhy z okapových svodů a provedeno položení odtok. rour.




10.7. - 12.7.2013

Nastoupili dva pracovníci Stavitelství a provedli podbourání a položení izolace pravého rohu budovy ze strany od lesa a k Vítečkovým.



15.7.2013

Nastoupilo 5 pracovníků Stavitelství a provádějí nahazování štítů a půlštoku v I. podlaží. Elektrikář p. Zářecký přivezl a připravil instalaci rozvaděče na budovu. S p. Kopsou dohodnuto a do stavebního deníku zapsáno zhotovení příčky a vložení dveří (80 levé, 2/3 prosklené) v chodbě mezi t.zv. administrativní částí a částí společenskou.

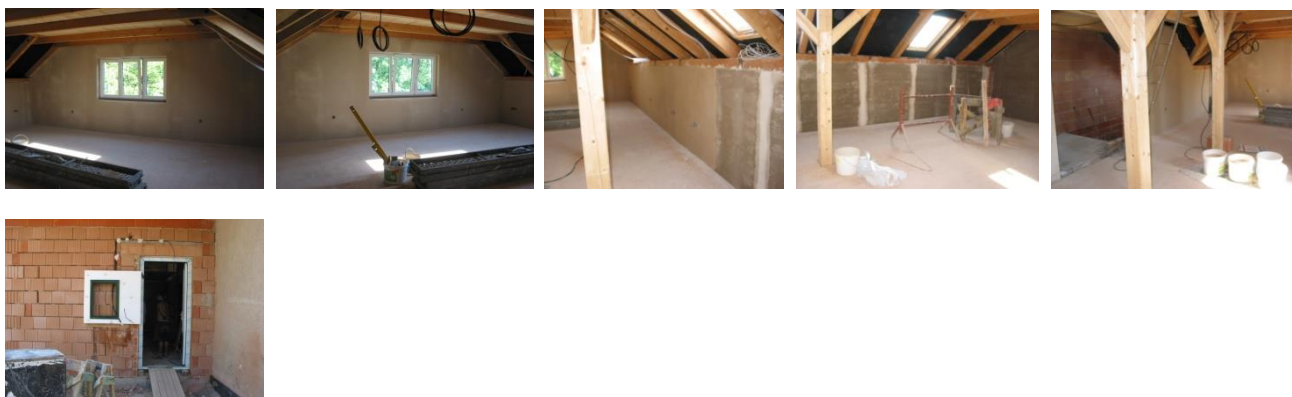

16.7. - 19.7. 2013

Pokračuje nahazování včetně štukování v I. podlaží. Vyzděna příčka v chodbě mezi t.zv. administrativní částí a částí společenskou. Dále byl proveden odvoz sutí a částečně urovnán terén před stavbou.



22.7. - 26.7.2013

Dokončeno nahazování včetně štukování v I. podlaží. Pokračuje nahazování v přízemí včetně prostoru pro schodiště.



29.7. - 30.7.2013

Pokračuje nahazování v přízemí včetně prostoru pro schodiště. Pod schodištěm započata stavba příčky. V archivu u kanceláře vysekán prostor pro světlík 48 x 60 cm pro osvětlení kuchyně. Tesař p.Plašil započal s přípravou bednění pro schodiště do I.podlaží.



31.7. 2013

Pokračuje nahazování a štukování v přízemí a příprava bednění pro schodiště. Dokončena příčka ke schodišti. Zajištění schodiště nad překladem bude provedeno zasekanými trny po schodnicemi. Nastoupili elektrikáři od p.Zářeckého a dokončují instalaci uvnitř budovy. Odeslána na ČEZ podepsaná smlouva o připojení odběrného místa.



5.8.2013

Nastoupila parta sádkartonářů - p.Pavlovec a spol. Dohodnuto neopláštění podpěrných trámů a umístění příček vzhledem k poloze komínu. Pokračuje práce na stavbě schodiště a zároveň i nahazování a štukování v přízemí. Stavona Libchavy nainstalovala poslední okno ve štítu k silnici a srovnala špatně zasazené dveře z kuchyně na zahradu.



6.8.2013

Pokračuje instalace sádkartonu v I.podlaží. Provedena částečná úprava terénu kolem přístavby (p.Hirsch 2), obsypáno štěrkem (drtí). Provádí se armování schodiště před betonáží. Vyvedena chránička pro kabel náhradního zdroje (centrály) vedle dveří ze skladu cca 150 cm pod budoucím chodníkem (bude označeno). Zjištěno, že v projektu není oprava resp. odstranění odpadajících částí vnější fasády a bude řešeno jako vícepráce.



7.8.2013

Provedena betonáž schodiště. Započato s opravou venkovní fasády ze dvora od Vítěčkových.



8.8.2013

Pokračuje instalace sádkartonu v I.podlaží, kde elektrikář p.Zářecký konzultoval umístění kabeláže. S p.Zářeckým dohodnuta dodávka a instalace ventilátoru v kuchyni. Pokračuje oprava venkovní fasády ze dvora od Vítěčkových . Započato s přípravou na zateplení připevněním spodního oplechování a přivařením lepenkových izolačních pásů.



9.8.2013

Pokračuje instalace sádkartonu v I.podlaží. Započata práce na tepelné izolaci -- nalepování polystyrénu.




12.8.2013

Pokračuje instalace sádrokartonu v I.podlaží a nalepování polystyrénu. U severního štítu postaveno lešení a byla dokončena oprava venkovních omítek na staré části budovy. Vybrána barva omítky P 1022(béžovožlutá) a barva soklu K 123 (zelená s šedou mozaikou). Proveden záznam do stavebního deníku.



13.8. - 16.8.2013

Pokračuje instalace sádrokartonu v I.podlaží. Kolem objektu postaveno lešení a probíhá nalepování polystyrénu pro tepelnou izolaci.

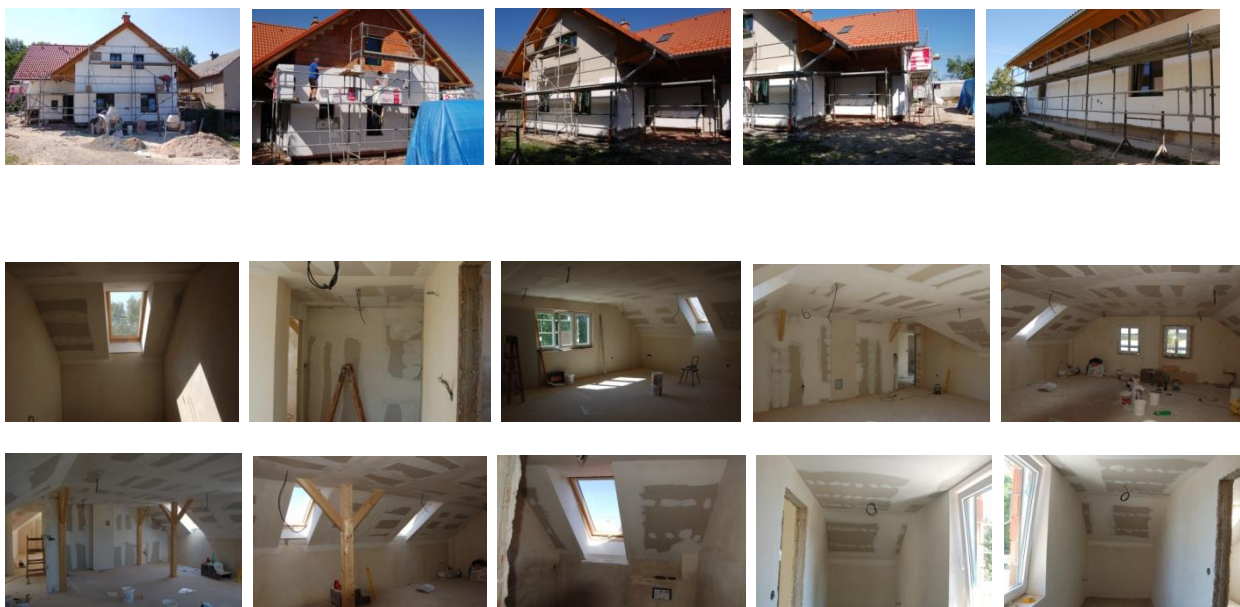

19.8.2013

Byla dokončena instalace sádrokartonu v I.podlaží. Kolem objektu postaveno lešení a dále probíhá nalepování polystyrénu pro tepelnou izolaci.




21.8.2013

Pokračuje instalace polystyrenu pro tepelnou izolaci. Nastoupil obkladač a započnuto s pokládáním dlažby ve WC a umyvárně v přízemí.



22.8.2013

Pokračuje instalace polystyrenu pro tepelnou izolaci. Obloženy obě WC. Stavona Libchavy provedla instalaci všech vnitřních parapetů a světlíku (okénka) mezi kuchyní a kancelářským archivem. Položen podkladový beton ve vstupní chodbě, pod schody a ve skladu (bojler). Provedeno odšalování spodní části schodiště.



23.8.2013


Pokračuje instalace polystyrenu pro tepelnou izolaci. Probíhá obkládání umyvárny.



27.8.2013

Započato natahování perlinky a štku(lepidla) na polystyren. Proveden úklid staveniště. Dovezena hlína od salaše pro urovnání terénu, které provedl p. Hirš 2. Obkladač pan Andrš z Osečnice začal pokládat dlažbu v I.podlaží. Pan Čvančara začal dělat rošt pro podhledy.






28.8.2013

Pokračuje natahování perlinky a štku(lepidla) na polystyren. Připojeno nové vedení vody. Vyměněn uzavírací ventil z hlavního řadu, instalována šachta pro uzávěr vody a vodoměr. Montáž provedli zaměstnanci Aquaservisu, pánové Ruffer a Dostál a vodoinstalatér pan Buben. Pan Andrš začal pokládat dlažbu v přízemí. Pan Čvančara pokračuje v montáži roštu pro podhledy. Připraven otvor pro dveře pod schody.



29.8.2013

Pokračuje natahování perlinky a štku(lepidla) na polystyren. Pan Čvančara pokračuje v montáži roštu pro podhledy a **instalaci CETRIX desek** 10 mm. Pan Andrš pokládá dlažbu v přízemí v chodbě a zasedačce. Dohodnuta dodávka dveřních klik a štítů (Schejbal).



30.8.2013

Dokončeno natahování perlinky a štku(lepidla) na polystyren. Dokončována instalace CETRIX desek (do dvora k Vítečkovým) a započato s přibíjením palubek na podhledy. Namontovány venkovní parapety. Obkladač pan Andrš položil dlažbu v zasedačce a v chodbě před kanceláří.

3.9.2013

Celé dopoledne silně pršelo. Na stavbě byl pouze obkladač pan Andrš. Pokládal dlažbu v kuchyni a chodbě.



4.9.2013

Na stavbě je pouze pan Andrš s pomocníkem. Pokládá dlažbu na schodiště a dokončují boční otěry stěn.

5.9.2013

Dokončena instalace palubek na podhledy. Pokračuje penetrování stěn . Obkladač pan Andrš s pomocníkem pokládá dlažbu na schody a obložení otěrů stěn.



6.9.2013

Pokračuje penetrace venkovních stěn a izolace přízemní venkovní fasády. Obkladač pan Andrš s pomocníkem spárují položené dlažby. Zábradlí schodiště si přijel vyměřit zámečník Vandas(subdodavatel Stavitelství Vbk) a bylo dohodnuto: z nerezového materiálu kostra a madla dřevěná. Majitel malířské a natěračské firmy pan Kubíček si prohlédl stavbu (malovat se bude vše bíle).



9.9.2013

Započato s prováděním fasády, ale pro silný déšť byla udělána jenom část u vchodu do kuchyně . Dodělávky na obkladech a dlažbě provedl pan Andrš. Počal pracovat i malíř od pana Kubíčka v I. podlaží.

10.9.2013

Byla dokončena kompletní fasáda, kromě stěny k Vítečkovým do dvora. Bohužel večer v 19.30 přišla bouřka a silný déšť se severním větrem smyl část fasády ze severního štítu (od silnice). V I.podlaží pracuje malíř od pana Kubíčka. Provedena demontáž a odvoz lešení, kromě lešení na náspi u Vítečků.

11.9.2013

Dodělána fasáda na stěně od Vítečkových. V I.podlaží pracuje malíř od pana Kubička. Provedena demontáž zbytku lešení. S panem Kopsou domluvena oprava severního štítu - provedení nového nátěru.



16.9.2013

Dovezen štěrtek do základu po zámkovou dlažbu a na jižním štítu položeny nové dlaždice. Malíř škrábe omítky v zasedačce a v kuchyni. Pan Buben(vodoinstalatér) přivezl bojler a provedl montáž klozetů.



17.9.2013

Započato s pokládáním zámkové dlažby, která byla dovezena. S JCB připravoval pan Hirschl základ a zasypával podklad pod dlažbu. Silně pršelo a terén nebylo možno upravovat. Malíř nepracoval.



18.9.2013

Na stavbě nikdo nepracoval.

19.9.2013

Pokračuje pokládání zámkové dlažby kolem východního štítu a před kuchyní.. Od salaše je navážena zemina a pokračuje též úprava terénu. Malíř škrabe a připravuje malbu v přízemí. Pan Buben instaluje umyvadlo v I.podlaží a sprchu v přízemí.



20.9.2013

Pokračuje úprava terénu včetně dovozu hlíny od salaše. Je přemístěna maringotka ze zahrady ke transformátoru na obecní pozemek. Položeny a zabetonovány obrubníky pro zámkovou dlažbu od hlavních dveří až k bránce u silnice. Malíř provádí většinou první nátěr v přízemí, a to v kuchyni, kanceláři a zasedačce.



23.9.2013

Pokračuje pokládání chodníku od branky k hlavnímu vchodu do budovy. Malíř provádí druhý nátěr v kuchyni a zasedačce. K severnímu štítu postaveno lešení pro opravu spláchnuté barvy, ale dodaná barva je nenamíchaná správně, lépe řečeno vůbec (je bílá). Položeny nové dlaždice k severnímu štítu a dokončeny úpravy terénu kolem chodníku. Elektrikáři mají nastoupit zítra.



24.9.2013

Dokončen chodník od branky ke vchodu do budovy. Zасыпán bílým pískem. Nastoupili elektrikáři a dokončují instalaci svítidel a rozvaděče. Malíř pracoval jen dopoledne.



25.9.2013

Přivezeny a instalovány akumulční kamna do zasedačky. Do obou WC, umyvárny a kuchyně namontovány přímotopy a ventilátor do kuchyně. Elektroinstalace je tím prakticky dokončena. Revizi bude provádět pan Žabokrtský. Malíř nepracoval. V kanceláři a archivu prováděl přípravu povrchu podlahář pan Cach.. Lino bylo rozloženo v zasedačce..



27.9.2013

Malíři dokončovali malbu v přízemí a provedli znovu nátěr severního štítu (od silnice), který poškodil přivalový déšť. Pan Kopsa se dvěma pracovníky odpoledne rozebral poslední zbytek lešení.



1.10.2013


Vodoinstalatér pan Buben s pomocníkem namontoval bojler. Firma K+M Studio(Majer a Kimmel) smontovala kuchyňskou linku včetně instalace vodovodní baterie a odpadu. Nasadil jsem vchodové dveře ke skladu u bojleru a namotoval zámek a novou kliku.



Ve 13 hodin byla provedena kontrolní prohlídka stavby za účasti pana Zimy (autorský dozor), pana Kopsy(stavbyvedoucí). Dohodnuty byly kroky nutné k úspěšné kolaudaci. Termín kolaudace byl stanoven na 22.10.2013. K žádosti o kolaudační souhlas bude nutno zajistit revizní zprávy elektroinstalace a komínů, geometrické zaměření stavby, pro hygienu zprávu o laboratorním vzorku vody (odběr ze dřezu),požární řád a poplachové směrnice a vybavení informačními a bezpečnostními tabulkami.

2.10.2013

Pan Buben dokončil instalaci sprchového koutu a bojleru.



3.10.2013


Tři pracovníci z firmy pana Schejbala z Třebelchovic začali s instalací 12 kusů dveří.



4.10.2013

Dnes dva pracovníci z firmy pana Schejbala z Třebelchovic dokončili instalaci 12 kusů dveří. Pan Vandas se spolupracovníkem přimontoval nerezovou kostru schodiště. Pracovník TelefonicyO2 přepojil pevnou linku z č.21 od Seidlů zpět do budovy OÚ č.1 a ve spolupráci s panem Matějkou z Megacomu provedli připojení telefonní a internetové linky.



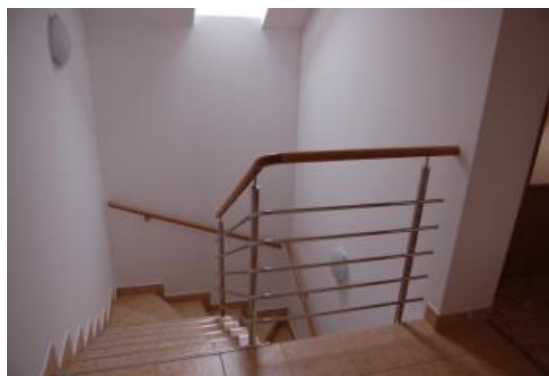

8.10.2013

Truhlář pan Jedlinský přijel namontovat madla na kostru zábradlí, ale neměl k dispozici pravoúhlý oblouk a tak po konzultaci s panem Vandasem jsem objednal madla včetně oblouku u firmy Dastech a dohodnul dodání do konce týdne (PPL na dobírku).

9.10.2013

Pracovník Stavitelství EU dokončoval pokládání dlažby a obkladů kolem obložek u dveří. Odpoledne přimontovali ve spolupráci s panem Kopsou ceduli OBECNÍ ÚŘAD na fasádu vlevo od hlavního rozvaděče elektřiny.

10.10.2013

Byla dodána madla od firmy Dastech včetně oblouku. Pracovník Stavitelství EU dokončil pokládání dlažby a obkladů kolem obložek u dveří. Pan Motyčka opravil a zapojil aku kamna v kanceláři

11.10.2013

. Dále byly dovezeny 2 fůry hlíny od salaše a 2 fůry kamene a pan Hirsch s JCB provedl dokonale (za pomoci vibračního válce) úpravu terénu před severním štítem. Nájezd od silnice upravil z freezingu a rovněž uválcoval. Odpoledne přijel pan Zárecký, připojil bojler, kuchyňský sporák a dokončil se 2 spolupracovníky zapojení zbývajících elektroinstalací.



14.10.2013

Zasel jsem a uválcoval plochu před štítem u silnice. Pan Žabokrtský dokončoval revizi elektroinstalací.

15.10.2013

Natěrač Kubiček a pan Hlava (specialista na požární nátěry) si prohlédli II.podlaží. Nátěry budou provedeny ve čtvrtek nebo v pátek. Pan Žabokrtský dokončoval revizi elektroinstalace.

16.10.2013

Parta pana Čvančary položila ve II.podlaží vrchní dřevotřískové broušené desky včetně okrajových lišt. Odpoledne jsem s pány Zimou (aut.dozor), Sloupenským a Kopsou procházel výkazy provedených prací a víceprací, dále pak změny stavby před dokončením (příčka v chodbě a plášť přístavby).

17.10.2013

Dnes natěrači od pana Kubička provedli nátěr včera položených podlah nitrolakem a rovněž nalakovali dřevěná madla zábradlí.

18.10.2013

Pan Hlava (specialista na požární nátěry) provedl nátěr sloupů ve II.podlaží protipožárním nátěrem.

22.10.2013

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY

Dne 3.10.2013 podala Obec Jahodov, Jahodov, 516 01 Rychnov nad Kněžnou žádost o vydání kolaudačního souhlasu, jehož předmětem je stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy obecního úřadu v Jahodově na pozemku: stavební parcela číslo 18/2, pozemková parcela číslo 20/2 v katastrálním území Jahodov.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 122 stavebního zákona známým účastníkům, že ústní jednání spojené s místním šetřením za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky se koná

22.10.2013 v 12:30 hodin,

se schůzkou na místě stavby.

K ústnímu jednání a ohledání stavby žadatel předloží:

1. Doklady o geometrickém zaměření stavby autorizovaným geodetem.
2. Dokumentaci skutečného provedení stavby podle ustanovení § 125 stavebního zákona.
3. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (revize elektroinstalace a hromosvodů, revize komína, tlaková zkouška rozvodů vody, zkouška těsnosti kanalizace, laboratorní výsledek vzorku pitné vody).
4. Záznamy stavebního deníku o kontrolních prohlídkách stavby.

5. Další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
Zdenka Zimová

Závěrečná prohlídka stavby proběhla ve shora uvedeném termínu. Kolaudační souhlas nebyl vydán pro nesouhlas zástupce HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou s tím, že vlezový otvor do půdního prostoru byl opatřen skládacími schody bez požadované protipožární odolnosti. Ostatní podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu byly splněny.

Vlezový otvor byl osazen revizními dvířky se zámkem do sádkartonových systémů s protipožární odolností.

Objednáno u pana Pavlovce a provedeno dne 30.10.2013





Dne 8.11.2013 jsme obdrželi kolaudační souhlas.

Č.j.: OVŽP-29011/13-Zi 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz
Č.j.: OVŽP-29011/13-Zi Rychnov nad Kněžnou, dne 8. listopadu 2013
S.z.: OVŽP-5289/2013-Zi
Oddělení: stavební úřad
Vyřizuje: Zdenka Zimová
e-mail: Zdenka.Zimova@rychnov-city.cz
1. Obec Jahodov, Jahodov čp.1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Dne 3.10.2013 podala Obec Jahodov, Jahodov čp.1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby, jehož předmětem je stavba: **Stavební úpravy a přístavba budovy obecního úřadu v Jahodově** povolené na pozemku: stavební parcela číslo 18/2, pozemková parcela číslo 20/2 v katastrálním území Jahodov, na kterou Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí uzavřel dne 3.12.2012 pod č.j.: OVŽP-28648/12-Zi veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby.

K projednání žádosti Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), podle § 122 stavebního zákona nařídil místní ohledání za účelem provedení závěrečné kontrolní

prohlídky stavby na den 22.10.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Bylo zjištěno, že stavba je provedena v souladu s povolením stavby a ověřenou projektovou dokumentací a že byly dodrženy podmínky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení stavby.

Stavba je provedena v souladu se stanovisky a závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů. Byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby ani její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost ani životní prostředí.

Nepodstatné odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace, které jsou v ní vyznačeny, nevyžadují zvláštní řízení a stavební úřad je vzal na vědomí při místním šetření. Stavební úřad, na základě kontrolní prohlídky, doložených dokladů a závazných stanovisek, vyhodnotil, že jsou splněny podmínky podle § 119 odst.2. stavebního zákona.

Po přezkoumání žádosti a na základě výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavby, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí podle § 122 stavebního zákona Č.j.: OVŽP-29011/13-Zi 2

p o v o l u j e u ž í v á n í

budovy obecního úřadu v Jahodově po provedení stavebních úprav a přístavby na pozemku: stavební parcela číslo 18/2 v katastrálním území Jahodov.

Stavba obsahuje:

V I.NP – zádveří, WC, umývárnu, chodbu, kancelář, archiv, zasedací místnost, kuchyňku, sklad úklidových prostředků, sklad

Ve II.NP - chodbu, archiv, klubovnu, společenskou místnost, WC

O výsledku závěrečné kontrolní prohlídky stavby byl sepsán protokol, který obsahuje podmínky pro trvalé užívání stavby (provedení nehořlavé podlahy nebo položení nehořlavé podložky v případě osazení kamen na dřevo v místnosti ve II.NP).

referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
Zdenka Zimová

Na vědomí:

1. HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti č.p.2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2. KHS Královéhradeckého kraje územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova č.p.1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. archiv

Tímto aktem byl projekt dokončen.



Tento projekt, "Stavební úpravy a přestavba budovy Obecního úřadu v Jahodově" byl realizován za podpory Královéhradeckého kraje.
